# Hovedtidsplan med Ydelsesplan iht. ABR18

Bilag 4 til totalrådgivningsaftale vedr. 0284 Blåvand Bymidte

SLETH

Revision A. 2023-01-25
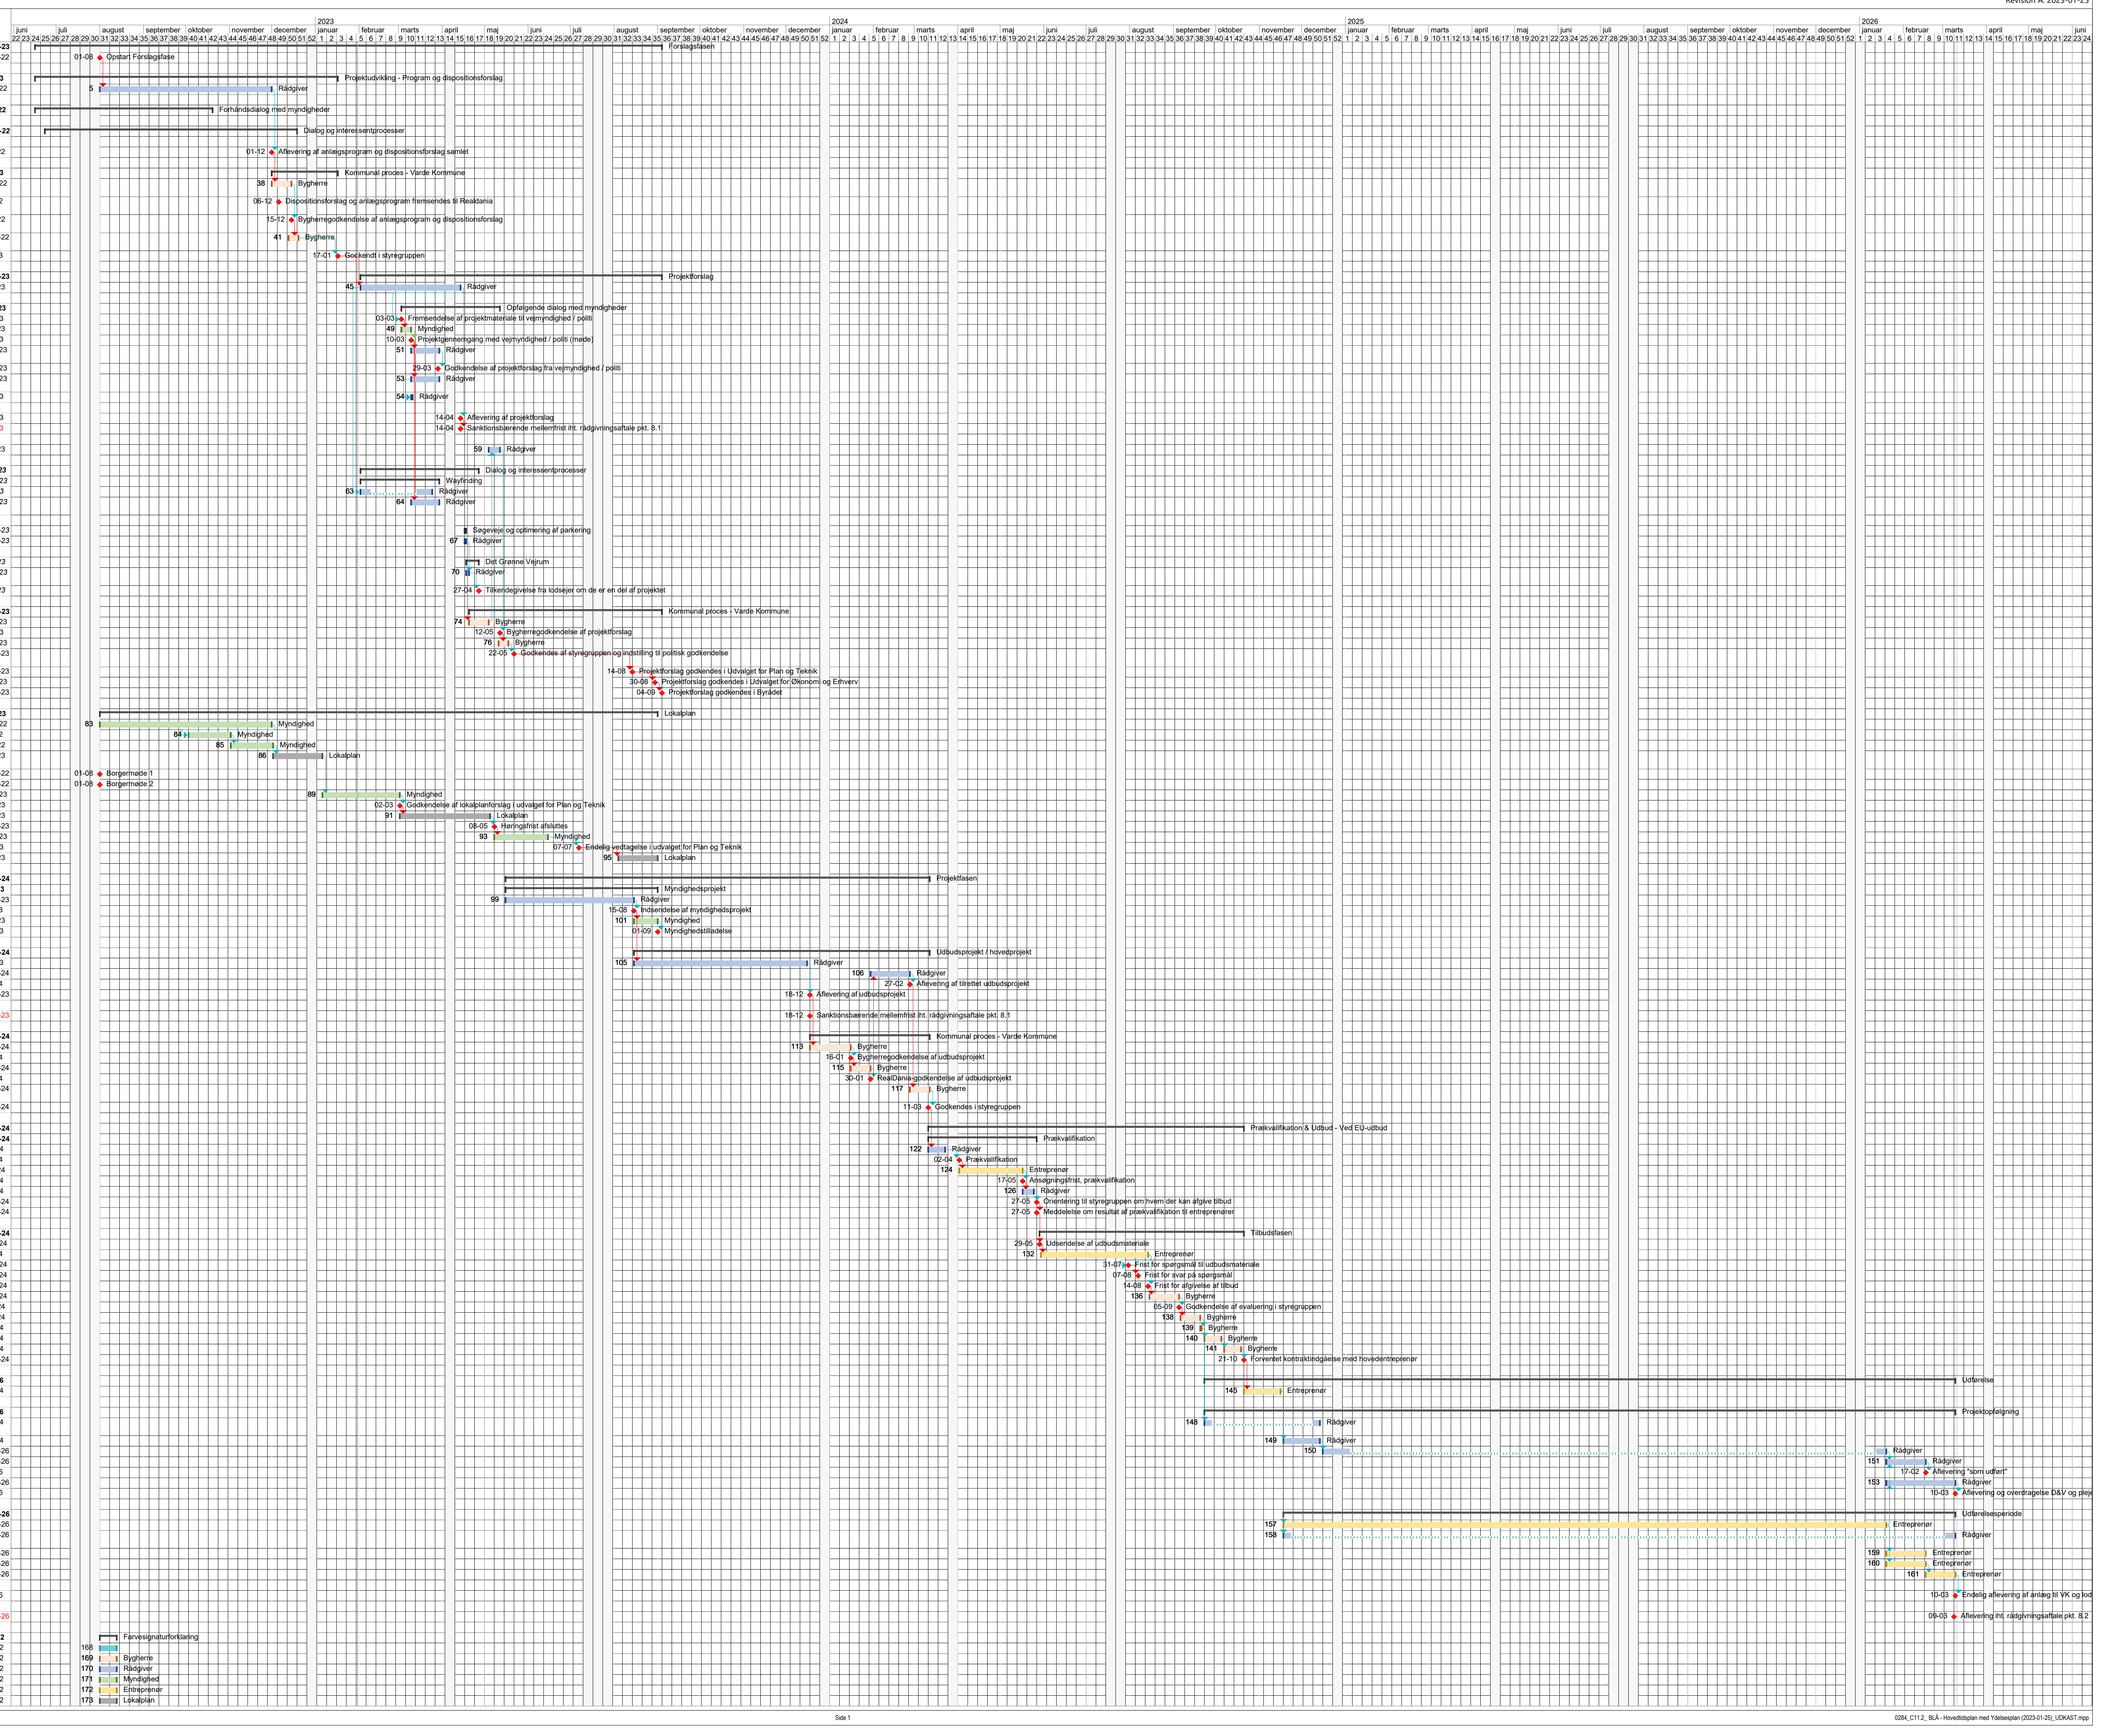
| Id | Opgavenavn | Varighed | Tekst1 | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Forslagsfasen** | **272 dage?** | | **to 16-06-22** | **ma 04-09-23** |
| 2 | Opstart Forslagsfase | 0 dage | | ma 01-08-22 | ma 01-08-22 |
| 3 | | | | | |
| 4 | **Projektudvikling - Program og dispositionsforslag** | **133 dage** | | **to 16-06-22** | **ti 17-01-23** |
| 5 | Projektarbejde - Programmering og disponering | 88 dage | Rådgiver | ma 01-08-22 | on 30-11-22 |
| 6 | | | | | |
| 7 | **Forhåndsdialog med myndigheder** | **75 dage** | | **to 16-06-22** | **to 20-10-22** |
| 15 | | | | | |
| 16 | ***Dialog og interessentprocesser*** | ***112 dage*** | | ***to 23-06-22*** | ***ma 19-12-22*** |
| 34 | | | | | |
| 35 | Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag samlet | 0 dage | Rådgiver | to 01-12-22 | to 01-12-22 |
| 36 | | | | | |
| 37 | **Kommunal proces - Varde Kommune** | **28 dage** | | **to 01-12-22** | **ti 17-01-23** |
| 38 | Bygherregennemsyn af anlægsprogram og dispositionsforslag | 10 dage | Bygherre | to 01-12-22 | on 14-12-22 |
| 39 | Dispositionsforslag og anlægsprogram fremsendes til Realdania | 0 dage | Bygherre | ti 06-12-22 | ti 06-12-22 |
| 40 | Bygherregodkendelse af anlægsprogram og dispositionsforslag | 0 dage | Bygherre | to 15-12-22 | to 15-12-22 |
| 41 | Styregruppens gennemsyn af anlægsprogram og dispositionsforslag | 5 dage | Bygherre | ti 13-12-22 | ma 19-12-22 |
| 42 | Godkendt i styregruppen | 0 dage | Bygherre | ti 17-01-23 | ti 17-01-23 |
| 43 | | | | | |
| 44 | **Projektforslag** | **127 dage?** | | **to 02-02-23** | **ma 04-09-23** |
| 45 | Projektarbejde - Projektering | 45 dage | Rådgiver | to 02-02-23 | to 13-04-23 |
| 46 | | | | | |
| 47 | **Opfølgende dialog med myndigheder** | **43 dage?** | | **fr 03-03-23** | **to 11-05-23** |
| 48 | Fremsendelse af projektmateriale til vejmyndighed / politi | 0 dage | Rådgiver | fr 03-03-23 | fr 03-03-23 |
| 49 | Sagsbehandling vejmyndighed / politi | 5 dage | Myndighed | fr 03-03-23 | to 09-03-23 |
| 50 | Projektgennemgang med vejmyndighed / politi (møde) | 0 dage | Møde | fr 10-03-23 | fr 10-03-23 |
| 51 | Evt. tilretning af projektforslag efter dialog med vejmyndighed / politi | 14 dage | Rådgiver | fr 10-03-23 | on 29-03-23 |
| 52 | Godkendelse af projektforslag fra vejmyndighed / politi | 0 dage | Myndighed | on 29-03-23 | on 29-03-23 |
| 53 | Opfølgende dialog med fredningsnævnet (proces afklares nærmere) | 14 dage | Rådgiver | fr 10-03-23 | on 29-03-23 |
| 54 | Arkæologi (proces afklares nærmere) | 1 dag? | Rådgiver | fr 10-03-23 | fr 10-03-23 |
| 55 | | | | | |
| 56 | Aflevering af projektforslag | 0 dage | | fr 14-04-23 | fr 14-04-23 |
| 57 | Sanktionsbærende mellemfrist iht. rådgivningsaftale pkt. 8. | 0 dage | Rådgiver | fr 14-04-23 | fr 14-04-23 |
| 58 | | | | | |
| 59 | Tilretning iht. bygherregennemsyn | 5 dage | Rådgiver | to 04-05-23 | to 11-05-23 |
| 60 | | | | | |
| 61 | ***Dialog og interessentprocesser*** | ***54 dage*** | | ***to 02-02-23*** | ***to 27-04-23*** |
| 62 | *Wayfinding* | *40 dage* | | *to 03-02-23* | *on 29-03-23* |
| 63 | *Wayfinding integreres som en del af de øvrige projekter* | *14 dage* | *Rådgiver* | *to 02-02-23* | *fr 24-03-23* |
| 64 | *Evt. tilretning af projektforslag efter forhåndsdialog med vejmyndighed / politi* | *14 dage* | *Rådgiver* | *fr 10-03-23* | *on 29-03-23* |
| 65 | | | | | |
| 66 | *Sagevejs og optimering af parkering* | *1 dag* | | *ma 17-04-23* | *ma 17-04-23* |
| 67 | *De enkelte vejforløb fremlægges for de berørte lodsejer* | *1 dag* | *Rådgiver* | *ma 17-04-23* | *ma 17-04-23* |
| 68 | | | | | |
| 69 | *Det Grønne Vejrum* | *7 dage* | | *ti 18-04-23* | *to 27-04-23* |
| 70 | *Fremlæggelse af økonomi og projekt ved de berørte lodsejer* | *2 dage* | *Rådgiver* | *ti 18-04-23* | *on 19-04-23* |
| 71 | *Tilkendegivelse fra lodsejer om de er en del af projektet* | *0 dage* | *Bygherre* | *to 27-04-23* | *to 27-04-23* |
| 72 | | | | | |
| 73 | **Kommunal proces - Varde Kommune** | **78 dage** | | **to 20-04-23** | **ma 04-09-23** |
| 74 | Bygherregennemsyn af projektforslag | 10 dage | Bygherre | to 20-04-23 | on 03-05-23 |
| 75 | Bygherregodkendelse af projektforslag | 0 dage | Bygherre | fr 12-05-23 | fr 12-05-23 |
| 76 | Styregruppens gennemsyn af projektforslag | 5 dage | Bygherre | to 11-05-23 | on 17-05-23 |
| 77 | Godkendes af styregruppen og indstilling til politisk godkendelse | 0 dage | Bygherre | ma 22-05-23 | ma 22-05-23 |
| 78 | Projektforslag godkendes i Udvalget for Plan og Teknik | 0 dage | Bygherre | ma 14-08-23 | ma 14-08-23 |
| 79 | Projektforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhve | 0 dage | Bygherre | on 30-08-23 | on 30-08-23 |
| 80 | Projektforslag godkendes i Byrådet | 0 dage | Bygherre | ma 04-09-23 | ma 04-09-23 |
| 81 | | | | | |
| 82 | **Lokalplan** | **254 dage?** | | **ma 01-08-22** | **to 31-08-23** |
| 83 | Udarbejdelse af MV screening/ evt. scooping | 88 dage | Myndighed | ma 01-08-22 | on 30-11-22 |
| 84 | Intern høring | 22 dage | Myndighed | ma 03-10-22 | ti 01-11-22 |
| 85 | Høring af berørte myndigheder | 22 dage | Myndighed | on 02-11-22 | to 01-12-22 |
| 86 | Offentlig forhøring af lokalplan og MV screening herunder drøftelse med styregruppe og Realdania | 20 dage | Lokalplan | fr 02-12-22 | to 05-01-23 |
| 87 | Borgermøde 1 | 0 dage | Myndighed | ma 01-08-22 | ma 01-08-22 |
| 88 | Borgermøde 2 | 0 dage? | Myndighed | ma 01-08-22 | ma 01-08-22 |
| 89 | Behandling af de indkomnet bemærkninger | 39 dage | Myndighed | fr 06-01-23 | on 01-03-23 |
| 90 | Godkendelse af lokalplanforslag i udvalget for Plan og Teknik | 0 dage | Myndighed | to 02-03-23 | to 02-03-23 |
| 91 | Udsendes i offentlig høring (6 uger) | 40 dage | Lokalplan | to 02-03-23 | to 04-05-23 |
| 92 | Høringsfrist afsluttes | 0 dage | Lokalplan | ma 08-05-23 | ma 08-05-23 |
| 93 | Behandling af indkomnen bemærkninger | 25 dage | Myndighed | ma 08-05-23 | on 14-06-23 |
| 94 | Endelig vedtagelse i udvalget for Plan og Teknik | 0 dage | Myndighed | fr 07-07-23 | fr 07-07-23 |
| 95 | Klagefrist af planen ( 4 uger) | 20 dage | Lokalplan | fr 04-08-23 | to 31-08-23 |
| 96 | | | | | |
| 97 | **Projektfasen** | **191 dage** | | **ti 16-05-23** | **ma 11-03-24** |
| 98 | **Myndighedsprojekt** | **60 dage** | | **ti 16-05-23** | **fr 01-09-23** |
| 99 | Myndighedsprojekt | 47 dage | Rådgiver | ti 16-05-23 | ma 14-08-23 |
| 100 | Indsendelse af myndighedsprojekt | 0 dage | Rådgiver | ti 15-08-23 | ti 15-08-23 |
| 101 | Kommunal sagsbehandling | 13 dage | Myndighed | ti 15-08-23 | to 31-08-23 |
| 102 | Myndighedstilladelse | 0 dage | Myndighed | fr 01-09-23 | fr 01-09-23 |
| 103 | | | | | |
| 104 | **Udbudsprojekt / hovedprojekt** | **144 dage** | | **ti 15-08-23** | **ma 11-03-24** |
| 105 | Udbudsprojekt | 89 dage | Rådgiver | ti 15-08-23 | fr 15-12-23 |
| 106 | Tilretning af udbudsprojekt | 20 dage | Rådgiver | ti 30-01-24 | ma 26-02-24 |
| 107 | Aflevering af tilrettet udbudsprojekt | 0 dage | Rådgiver | ti 27-02-24 | ti 27-02-24 |
| 108 | Aflevering af udbudsprojekt | 0 dage | Rådgiver | ma 18-12-23 | ma 18-12-23 |
| 109 | | | | | |
| 110 | Sanktionsbærende mellemfrist iht. rådgivningsaftale pkt. 8.1 | 0 dage | Rådgiver | ma 18-12-23 | ma 18-12-23 |
| 111 | | | | | |
| 112 | **Kommunal proces - Varde Kommune** | **55 dage** | | **ma 18-12-23** | **ma 11-03-24** |
| 113 | Bygherregennemsyn af udbudsprojekt | 15 dage | Bygherre | ma 18-12-23 | ma 15-01-24 |
| 114 | Bygherregodkendelse af udbudsprojekt | 0 dage | Bygherre | ti 16-01-24 | ti 16-01-24 |
| 115 | RealDania-gennemsyn af udbudsprojekt | 10 dage | Bygherre | ti 16-01-24 | ma 29-01-24 |
| 116 | RealDania-godkendelse af udbudsprojekt | 0 dage | Bygherre | ti 30-01-24 | ti 30-01-24 |
| 117 | Bygherregodkendelse af udbudsprojekt, inkl. brugerinddragelse | 10 dage | Bygherre | ti 27-02-24 | ma 11-03-24 |
| 118 | Godkendes i styregruppen | 0 dage | Bygherre | ma 11-03-24 | ma 11-03-24 |
| 119 | | | | | |
| 120 | **Prækvalifikation & Udbud - Ved EU-udbud** | **136 dage** | | **ma 11-03-24** | **ma 21-10-24** |
| 121 | **Prækvalifikation** | **45 dage** | | **ma 11-03-24** | **ma 27-05-24** |
| 122 | Rådgiver udarbejder prækvalifikationsmateriale | 10 dage | Rådgiver | ma 11-03-24 | fr 22-03-24 |
| 123 | Prækvalifikation | 0 dage | Rådgiver | ti 02-04-24 | ti 02-04-24 |
| 124 | Ansøgningsperiode | 30 dage | Entreprenør | ti 02-04-24 | to 16-05-24 |
| 125 | Ansøgningsfrist, prækvalifikation | 0 dage | Entreprenør | fr 17-05-24 | fr 17-05-24 |
| 126 | Evaluering/udvælgelse af bydende entreprenører | 5 dage | Rådgiver | fr 17-05-24 | fr 24-05-24 |
| 127 | Orientering til styregruppen om hvem der kan afgive tilbud | 0 dage | Rådgiver | ma 27-05-24 | ma 27-05-24 |
| 128 | Meddelelse om resultat af prækvalifikation til entreprenører | 0 dage | Rådgiver | ma 27-05-24 | ma 27-05-24 |
| 129 | | | | | |
| 130 | **Tilbudsfasen** | **89 dage** | | **on 29-05-24** | **ma 21-10-24** |
| 131 | Udsendelse af udbudsmateriale | 0 dage | Bygherre | on 29-05-24 | on 29-05-24 |
| 132 | Kalkulationsperiode | 40 dage | Entreprenør | to 30-05-24 | ti 13-08-24 |
| 133 | Frist for spørgsmål til udbudsmateriale | 0 dage | Entreprenør | on 31-07-24 | on 31-07-24 |
| 134 | Frist for svar på spørgsmål | 0 dage | Bygherre | on 07-08-24 | on 07-08-24 |
| 135 | Frist for afgivelse af tilbud | 0 dage | Entreprenør | on 14-08-24 | on 14-08-24 |
| 136 | Bedømmelse / tilbudsevaluering | 15 dage | Bygherre | to 15-08-24 | on 04-09-24 |
| 137 | Godkendelse af evaluering i styregruppen | 0 dage | Bygherre | to 05-09-24 | to 05-09-24 |
| 138 | Dialog med RealDania om prioritering af tilbud | 10 dage | Bygherre | fr 06-09-24 | to 19-09-24 |
| 139 | Tildeling og afslag | 1 dag | Bygherre | fr 20-09-24 | fr 20-09-24 |
| 140 | Stand still periode | 10 dage | Bygherre | ma 23-09-24 | fr 04-10-24 |
| 141 | Kontrahering | 10 dage | Bygherre | ma 07-10-24 | fr 18-10-24 |
| 142 | Forventet kontraktindgåelse med hovedentreprenør | 0 dage | Bygherre | ma 21-10-24 | ma 21-10-24 |
| 143 | | | | | |
| 144 | **Udførelse** | **337 dage** | | **ma 23-09-24** | **ti 10-03-26** |
| 145 | Mobilisering (UE-kontrahering mv.) | 20 dage | Entreprenør | ma 21-10-24 | fr 15-11-24 |
| 146 | | | | | |
| 147 | **Projektopfølgning** | **337 dage** | | **ma 23-09-24** | **ti 10-03-26** |
| 148 | (evt. projekttilretning / udførelsesprojekt i tilfælde af sparerunde - proces efter aftale hvis aktuelt) | 10 dage | Rådgiver | ma 23-09-24 | fr 13-12-24 |
| 149 | Projektgennemgang med entreprenører | 20 dage | Rådgiver | ma 18-11-24 | fr 13-12-24 |
| 150 | Projektopfølgning, løbende | 11 dage | Rådgiver | ma 16-12-24 | ma 19-01-26 |
| 151 | "Som udført"-projektopretning | 20 dage | Rådgiver | ti 20-01-26 | ma 16-02-26 |
| 152 | Aflevering "som udført" | 0 dage | Rådgiver | ti 17-02-26 | ti 17-02-26 |
| 153 | D&V-materiale, plejeplaner, dialog driftsorganisation | 35 dage | Rådgiver | ti 20-01-26 | ma 09-03-26 |
| 154 | Aflevering og overdragelse D&V og pleje | 0 dage | Rådgiver | ti 10-03-26 | ti 10-03-26 |
| 155 | | | | | |
| 156 | **Udførelsesperiode** | **297 dage** | | **ma 18-11-24** | **ma 09-03-26** |
| 157 | Byggeperiode | 262 dage | Entreprenør | ma 18-11-24 | ma 19-01-26 |
| 158 | Dialog og formidling med interessenter om udførelse af anlægsarbejder | 10 dage | Rådgiver | ma 18-11-24 | ma 09-03-26 |
| 159 | Færdiggørelse | 20 dage | Entreprenør | ti 20-01-26 | ma 16-02-26 |
| 160 | Commissioning / mangelafhjælpning | 20 dage | Entreprenør | ti 20-01-26 | ma 16-02-26 |
| 161 | Afleveringsproces | 15 dage | Entreprenør | ti 17-02-26 | ma 09-03-26 |
| 162 | | | | | |
| 163 | Endelig aflevering af anlæg til VK og lodsejere | 0 dage | Entreprenør | ti 10-03-26 | ti 10-03-26 |
| 164 | | | | | |
| 165 | Aflevering iht. rådgivningsaftale pkt. 8.2 | 0 dage | Rådgiver | ma 09-03-26 | ma 09-03-26 |
| 166 | | | | | |
| 167 | **Farvesignaturforklaring** | **10 dage** | | **ma 01-08-22** | **fr 12-08-22** |
| 168 | Gantt 0 (aktivitet ej fordelt på aktør/funktion/proces - f.eks. møde | 10 dage | | ma 01-08-22 | fr 12-08-22 |
| 169 | Gantt 1 - Bygherre (inkl. lodsejere) | 10 dage | Bygherre | ma 01-08-22 | fr 12-08-22 |
| 170 | Gantt 2 - Rådgiver (totalrådgiver og underrådgivere) | 10 dage | Rådgiver | ma 01-08-22 | fr 12-08-22 |
| 171 | Gantt 3 - Myndighed (alle myndigheder der sagsbehandler/høres | 10 dage | Myndighed | ma 01-08-22 | fr 12-08-22 |
| 172 | Gantt 4 - Entreprenør (inkl. underentreprenører og leverandører) | 10 dage | Entreprenør | ma 01-08-22 | fr 12-08-22 |
| 173 | Gantt 5 - Lokalplan (visning af proces) | 10 dage | Lokalplan | ma 01-08-22 | fr 12-08-22 |
